



Jernbaneverket

Utredningsprosjektet for høyhastighetsbaner



Mandat av 19. februar 2010

Jernbaneverket skal

”anbefale hvilke langsiktige strategier, basert på ulike handlingsalternativer, som bør legges til grunn for utviklingen av langdistanse persontogtransport i Sør-Norge.”

Beslutningsgrunnlag i god tid før behandlingen av NTP 2014-23



Mandat: Utredningsalternativer

- Referanse – videreføre dagens jernbanepolitikk på fjernstrekningene
- En mer offensiv videreutvikling av dagens jernbaneinfrastruktur – også utenfor IC-området
- Høyhastighetskonsepter som delvis bygger på dagens nett og IC-strategi
- Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer



Jernbaneverket

Mandat: Organisering og tidsplan

- Eget prosjekt – ekstern prosjektleder
 - Styringsgruppe ledet av Jernbaneverket
 - Ekspertpanel med kompetanse fra bl. a internasjonale høyhastighetsprosjekter
 - Internasjonal anbudskonkurranse for utredningsoppdraget
-
- **Tilråkning fra Jernbaneverket til Samferdselsdepartementet 1. februar 2012.**



Prosjektleder: Tom R Stillesby



- Har bred nasjonal og internasjonal erfaring innen prosjektledelse, forretningsutvikling og organisering
- Er i dag eier av rådgivingselskapet Danisman og partner i Strategy House
- Kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Mesta
- Har tidligere hatt topplederstillinger i ABB Offshore Systems/Vetco Aibel og Aker Engineering



Mandat styringsgruppe

- **Mandat:**

Styringsgruppa skal bidra til å sikre at prosjektet gjennomføres i tråd med Samferdselsdepartementets mandat for arbeidet når det gjelder:

- *Framdrift*
- *Gjennomføring av en åpen prosess*
- *Faglig tilnærming*
- *Rapportering*



Medlemmer styringsgruppen

- **Anita Skauge**, plan og utviklingsdirektør, Jernbaneverket
- **Bo Lennart Nelldal**, professor i togtrafikkplanlegging, KTH Stockholm
- **Thomas Havnegjerde**, adm. direktør i Espira Gruppen
- **Nils Olsson**, forsker NTNU
- **Siri Pettersen Strandenes**, professor i økonomi, NHH
- **Jon Frøisland**, spesialrådgiver Jernbaneverket
- **Dagfinn Berge**, daglig leder i Railconsult AS

Formål/mandat ekspertpanel

- **Formål:**

- er å sikre at prosjektet tilføres relevante internasjonale erfaringer og skal kunne trekkes inn enkeltvis eller som samlet panel, gjennom seminarer, uttalelser/innspill til dokumenter, som diskusjonspartner eller på andre egnede måter.

- **Mandat:**


Ekspertpanelet skal bistå prosjektleder i den utstrekning dette avtales med den enkelte paneldeltaker, og skal kunne sammenkalles 1-2 ganger årlig ved behov. Prosjektleder definerer behovet.




Medlemmer ekspertpanel

- **Gunnar Malm**, generaldirektør i Trafikverket
- **Ignacio Barrón**, direktør i International Union of Railways (UIC)
- **Oskar Fröidh**, doktor i infrastruktur og samf. planlegging, KTH Stockholm
- **Richard Eccles**, leder av ruteplanleggingsdivisjonen i det britiske jernbaneverket Network Rail.
- **Steinar Strøm**, professor i sosialøkonomi UIO
- **Kåre Petter Hagen**, professor i samfunns- og offentlig økonomi, NHH
- **Bjørn Nilsen**, professor i ingeniørgeologi ved NTNU

Organization

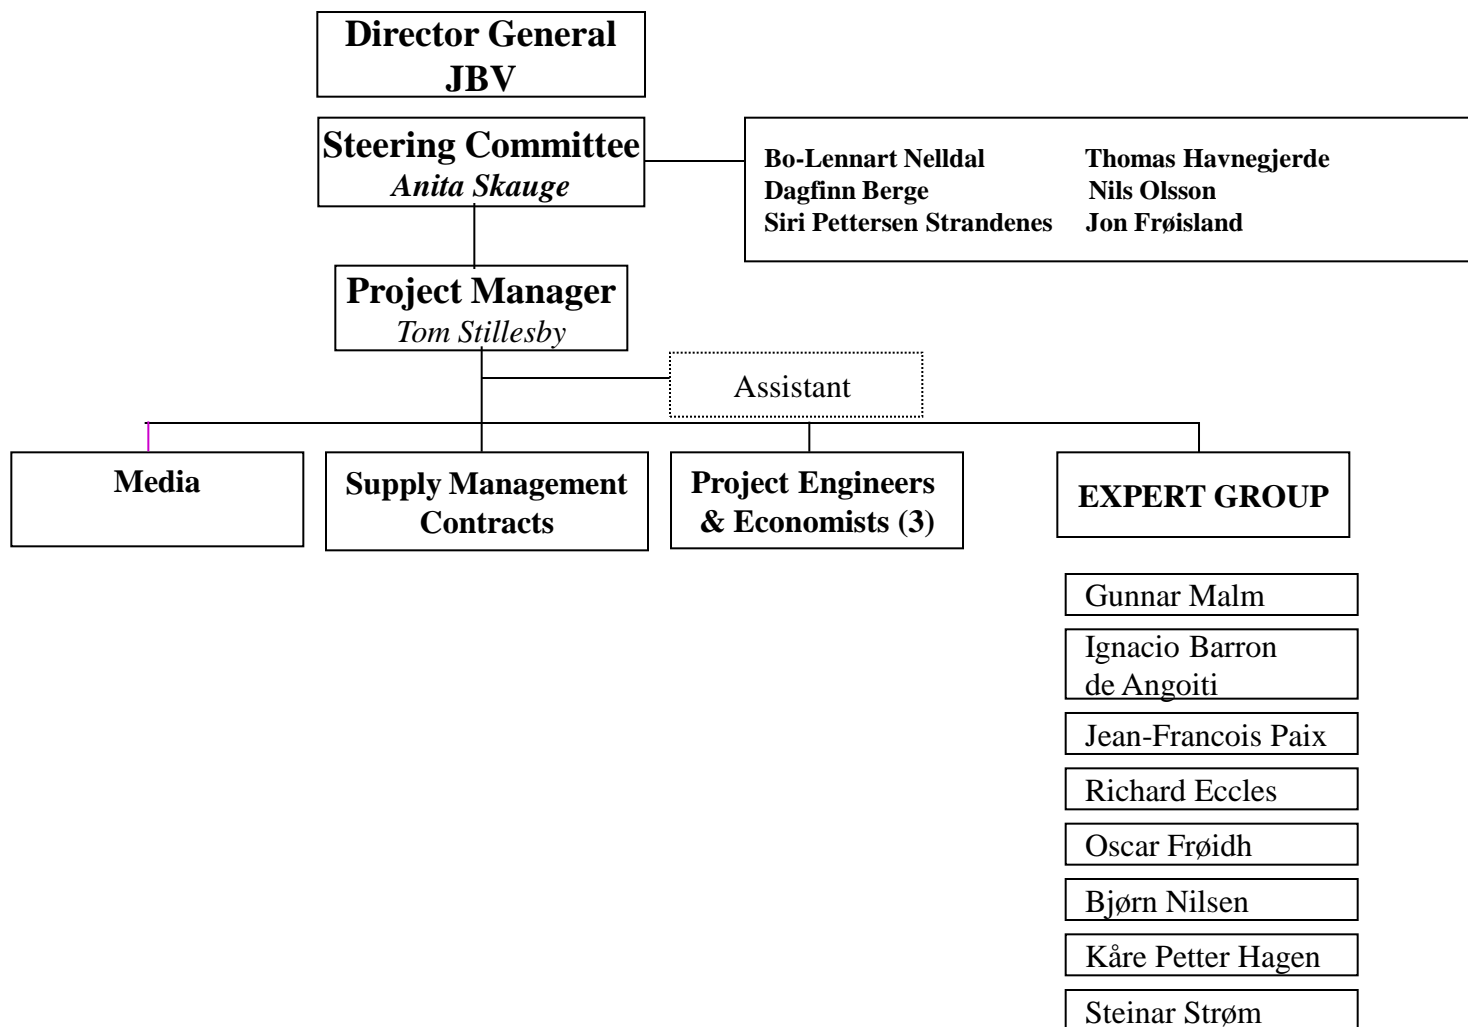

Project Main Plan 2010

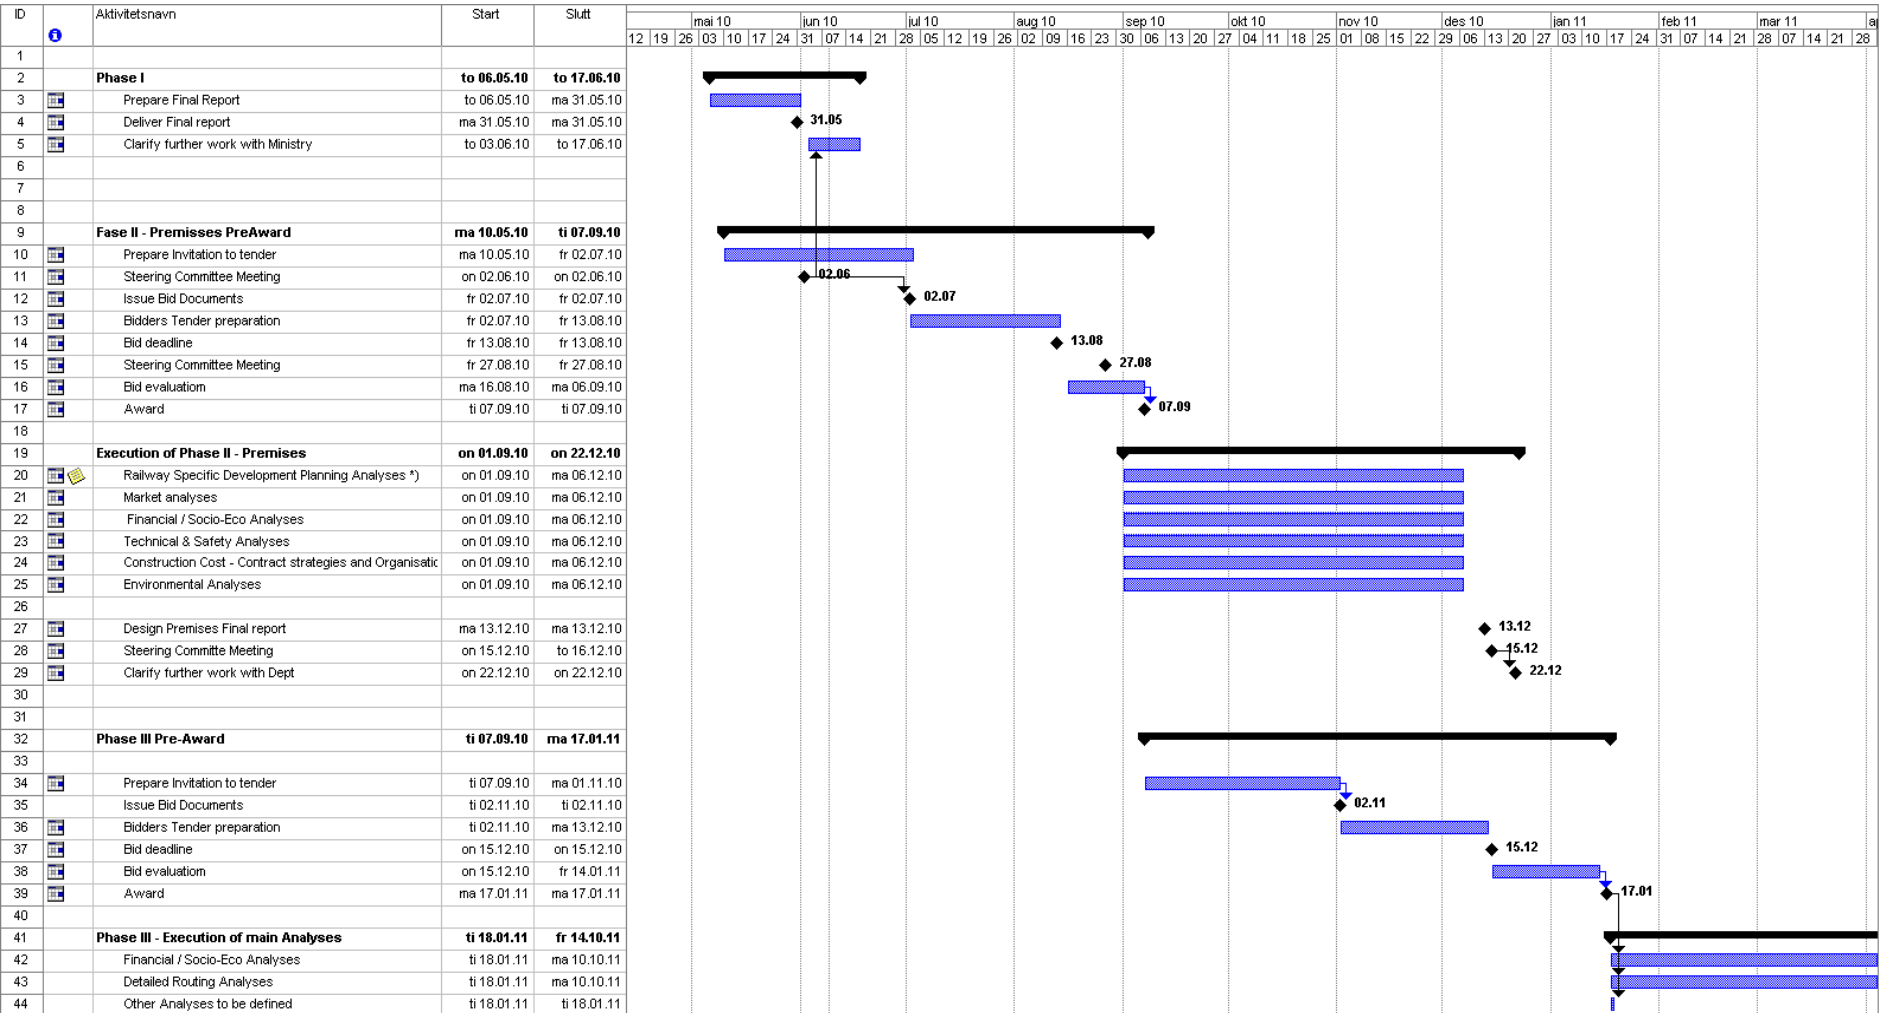

Project Main Plan 2011-12



ID	Aktivitetsnavn	Start	Slutt	mai 10							jun 10							jul 10							aug 10							sep 10							okt 10							nov 10							des 10							jan 11							feb 11							mar 11						
				12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26																										
31																																																																																
32	Phase III Pre-Award	ti 07.09.10	ma 17.01.11																																																																													
33																																																																																
34	Prepare Invitation to tender	ti 07.09.10	ma 01.11.10																																																																													
35	Issue Bid Documents	ti 02.11.10	ti 02.11.10																																																																													
36	Bidders Tender preparation	ti 02.11.10	ma 13.12.10																																																																													
37	Bid deadline	on 15.12.10	on 15.12.10																																																																													
38	Bid evaluation	on 15.12.10	fr 14.01.11																																																																													
39	Award	ma 17.01.11	ma 17.01.11																																																																													
40																																																																																
41	Phase III - Execution of main Analyses	ti 18.01.11	fr 14.10.11																																																																													
42	Financial / Socio-Eco Analyses	ti 18.01.11	ma 10.10.11																																																																													
43	Detailed Routing Analyses	ti 18.01.11	ma 10.10.11																																																																													
44	Other Analyses to be defined	ti 18.01.11	ti 18.01.11																																																																													
45																																																																																
46	Oslo - Trondheim	ti 18.01.11	ma 10.10.11																																																																													
47	Oslo - Bergen	ti 18.01.11	ma 10.10.11																																																																													
48	Oslo - Kristiansand - Stavanger	ti 18.01.11	ma 10.10.11																																																																													
49	Oslo - Göteborg	ti 18.01.11	ma 10.10.11																																																																													
50	Oslo - Stockholm	ti 18.01.11	ma 10.10.11																																																																													
51	Bergen - Haugesund - Stavanger	ti 18.01.11	ma 10.10.11																																																																													
52																																																																																
53	Plan of accomplishment	ti 18.01.11	ma 10.10.11																																																																													
54																																																																																
55	Phase III Final report	fr 14.10.11	fr 14.10.11																																																																													
56																																																																																
57	Prepare Final Report	ma 17.10.11	ti 31.01.12																																																																													
